N. ord.	Attività	Durata gg.
1	Consegna Lavori - Apprestamenti impianto di cantiere	3
2	Rimozione Impianto idrico e sanitari	18
3	Rimozione Impianto riscaldamento e radiatori	6
4	Rimozione linee impianto elettrico	4
5	Rimozione corpi illuminanti e/o comandi	3
6	Rimozione di serramenti interni ed esterni	3
7	Rimozione di rivestimenti in ceramica	10
8	Scrostamento intonaci	3
9	Rimozione di pavimenti in ceramica	9
10	Rimozione di sottofondi in cls	9
11	Demolizione di tavolati interni	10
12	Demolizione parziale di solai in cls e laterizio	4
13	F.e p. di voltini in profilati di acciaio (IPE NP HE)	6
14	Muratura in mattoni forati	3
15	Intonaco rustico su superfici verticali interne	10
16	Intonaco civile su superfici verticali interne	5
17	Realizzazione rete idrica e di scarico	13
18	Realizzazione rete di riscaldamento da collettore	10
19	Impianto elettrico completo	5
20	Sottofondo di pavimento	10
21	Pavimentazioni in piastrelle di monocottura	8
22	F. e p. di zoccolino in gres o monocottura	5
23	Rivestimenti interni in ceramica	20
24	Posa sanitari	10
25	Tinteggiatura superfici interne	5
26	F. e p. di pareti divisorie in laminato e alluminio	8
27	F. e p. serramenti esterni in alluminio	1
28	F. e p. porte interne in alluminio	5
29	F. e p. di controsoffitti in doghe di alluminio	2
30	Rimozione lattoneria	2
31	Rimozione di manti impermeabili in guaina bituminosa	5
32	Imprimitura a base bituminosa coperture piane	2
33	Schermo o barriera vapore con membrana bituminosa	4
34	Isolamento termico superfici orizzontali (coperture)	7
35	Impermeabilitz. con 2 strati di membrana bituminosa	5
36	Lattoneria in acciaio zincato prev.	3
37	Smantellamento cantiere	2
38	Fine lavori	1

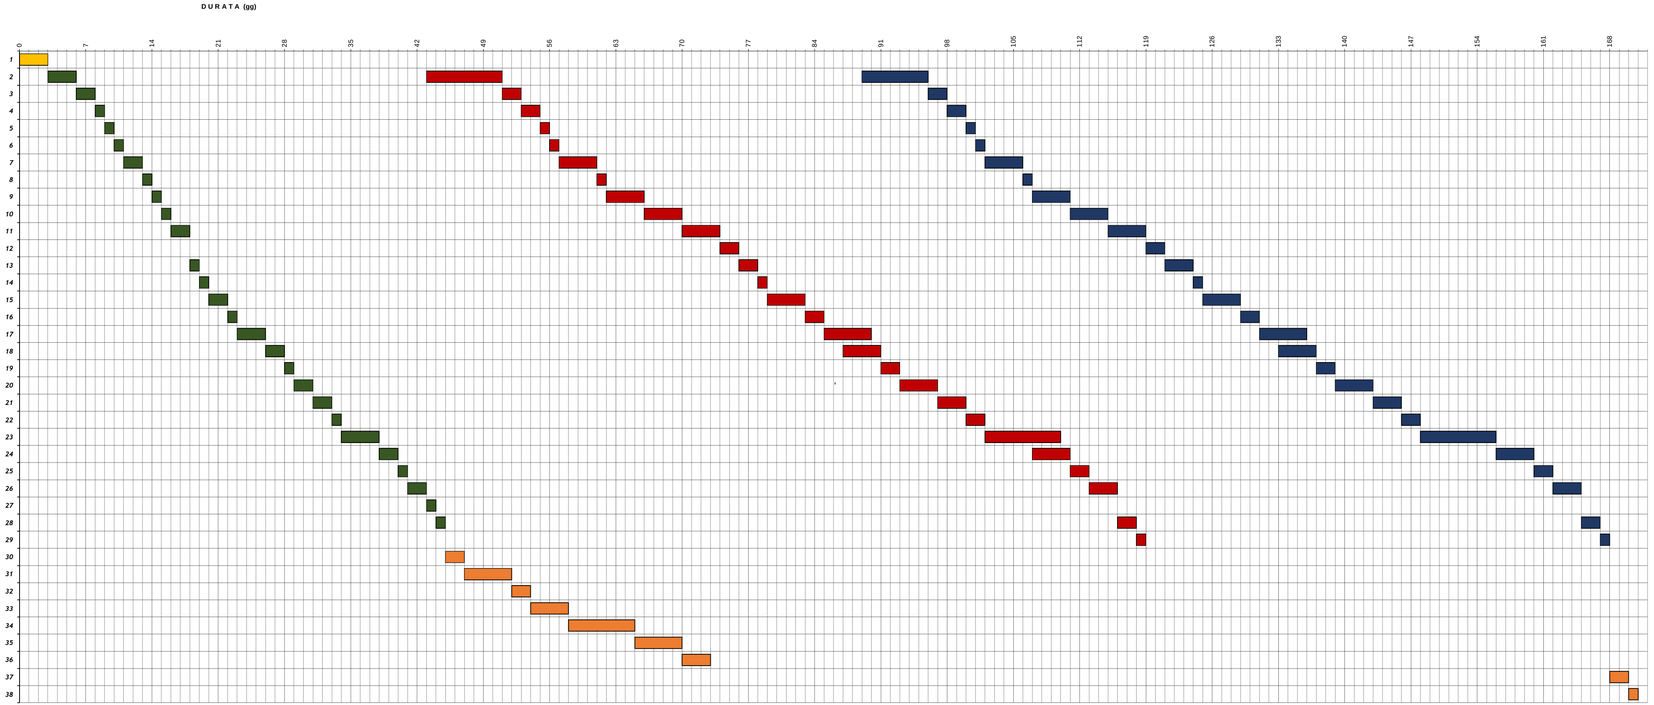

TC 170

giorni naturali e consecutivi
